

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023


MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

Pala, pico, tecnología...

reconstruyendo la economía


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA – GESTIÓN 2023

	Presupuesto Inicial 2023	Porcentaje de distribución	Ejecución Presupuestaria 2023	% de Ejecución presupuestaria
Inversión Pública	Bs624.868.848	74%	Bs602.952.459	96%
Previsión para gastos de inversión	Bs50.000.000	6%	presupuesto inscrito para gastos de inversión pública	
Gasto Corriente	Bs170.573.903	20%	Bs116.844.212	69%
TOTAL PRESUPUESTO	Bs845.442.751	100%	Bs719.796.671	85%

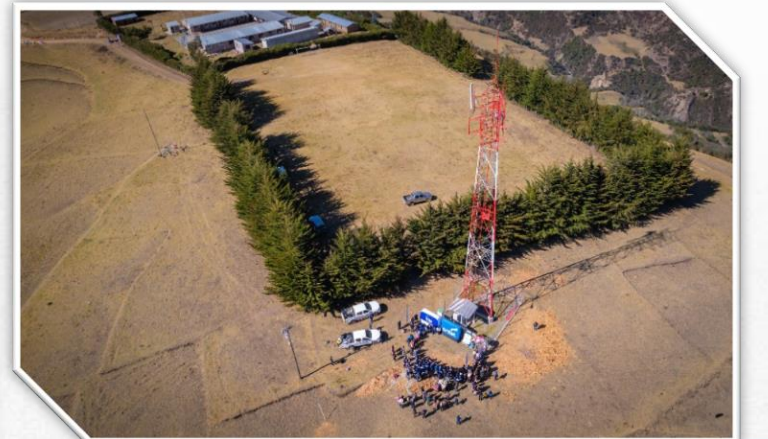


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA – GESTIÓN 2023

INVERSIÓN PÚBLICA - 2023

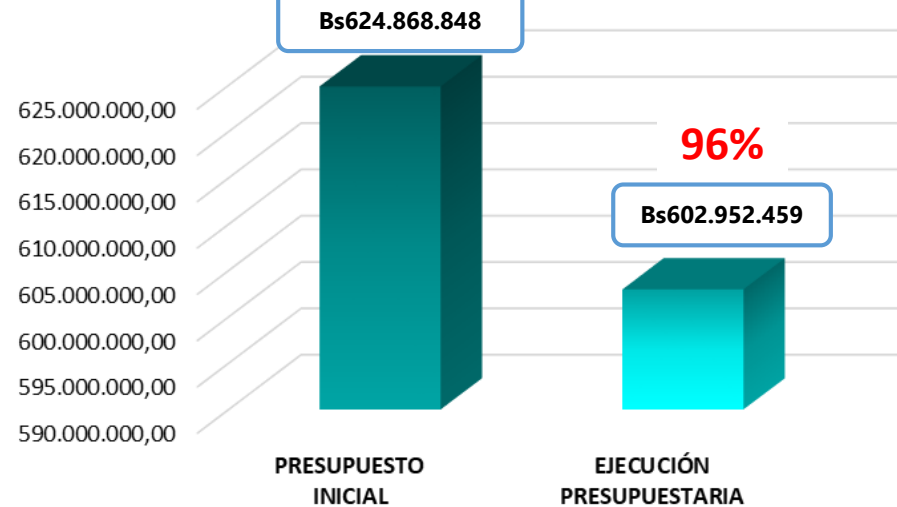

GASTO CORRIENTE - 2023

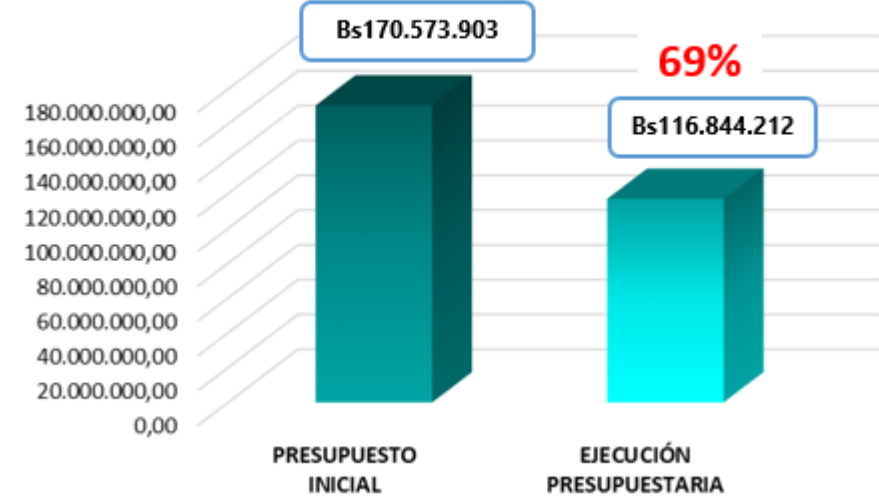

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECTOR

	Presupuesto Inicial 2023	Ejecución Presupuestaria 2023	Porcentaje de participación 2023
SECTOR TRANSPORTE	★ Bs448.489.413	Bs272.931.998	32%
SECTOR TELECOMUNICACIONES	Bs222.322.423	★ Bs330.020.461	39%
SECTOR VIVIENDA	Bs4.057.012	Bs0	0%
GASTO CORRIENTE	Bs170.573.903	Bs116.844.212	14%
TOTALES	Bs845.442.751	Bs719.796.671	85%



★ Incluye la bolsa sectorial de Bs 42.000.000 - IMPEM. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MULTISECTORIAL

★ Incluye Bs50.000.000 – considerados como Previsiones para proyectos de Inversión Pública

¿EN QUE PROYECTOS INVERTIMOS EN LA GESTIÓN 2023?

SECTOR - TRANSPORTE

Const. Tren Metropolitano de Cochabamba

Costo Total del Proyecto : Bs3.143.619.351,00

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs199.394.215,99



Const. de Obras Via Férrea Montero Bulo – Bulo

Costo Total del Proyecto : Bs2.124.220.717,00

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs48.584.784

Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI)


Costo Total del Proyecto : Bs20.580.000,00

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs10.442.546,16

Const. Hidrovía Ichilo-Mamoré (Tramo I)

Costo Total del Proyecto : Bs31.350.623,00

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs5.806.539,25

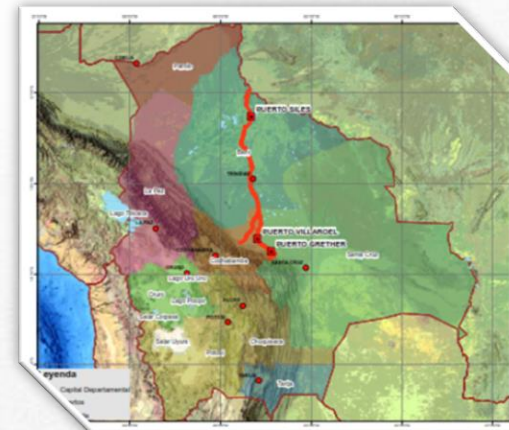

SECTOR - ÁEREO

Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto - Cap. Oriel Lea Plaza de la ciudad de Tarija (Proyecto Nuevo)

Costo Total del Proyecto: Bs278.464.158,98

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs3.425.014,71



Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto La Joya Andina de la ciudad de Uyuni-Potosí (Proyecto Nuevo)

Costo Total del Proyecto: Bs 134.507.841,02

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs. 105.804,80



Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del Proyecto - "Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto de Yacuiba- Tarija" (Proyecto Nuevo)

Costo Total del Proyecto : Bs 1.274.298,64

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs 1.019.438,91



SECTOR - ÁEREO

Mejoramiento Lado Aire Del Aeropuerto Riberalta (**Proyecto Nuevo**)

Costo Total del Proyecto: Bs3.785.604

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs3.750.728,53



Mejoramiento Lado Aire del Aeropuerto Guayaramerín (**Proyecto Nuevo**)

Costo Total del Proyecto: Bs7.765.135

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs403.425,56



SECTOR – TELECOMUNICACIONES

Implem. Instalación de Comunicaciones por Fibra Óptica Fase III

Costo total del Proyecto: Bs367.360.000,00

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs 6.542.134,47



Implem. Instalación de Comunicaciones por Radio Bases Fase III

Costo total del Proyecto: Bs251.482.000,00

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs46.775.652,00



SECTOR – TELECOMUNICACIONES

Instalación de Comunicaciones por Radio Bases Fase IV **(Proyecto de Continuidad con Nuevos Objetivos)**

Costo total del Proyecto: Bs708.627.341,09

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs 97.181.317,41

Gestión 2023 - Se firmo un contrato modificadorio incrementando 92 localidades rurales al Contrato Inicial



Instalación de Comunicaciones por Radio Bases Fase V **(Proyecto Nuevo)**

Costo total del Proyecto: Bs386.067.435,57

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs179.521.357,53



¿QUE PROYECTOS NUEVOS LICITAMOS EN LA GESTIÓN 2023?

Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Hidrovía ICHILO - MAMORÉ (Tramo II)

Costo Total del Proyecto : Bs 18.155.011,19



Estudio de Diseño Técnico Mejoramiento y Emplazamiento en el Aeropuerto de Villazón - Lampaya

Costo Total del Proyecto: Bs16.709.596,00

Estudio de Diseño Técnico Mejoramiento Ampliación del Aeropuerto de Guayaramerin

Costo Total Del Proyecto: Bs2.245.359,00

Estudio de Diseño Técnico Mejoramiento Ampliación del Aeropuerto de Puerto Suarez


Costo Total Del Proyecto: Bs2.580.512,00



Obras de Mejoramiento en el Aeropuerto de Puerto Suarez

Costo total del proyecto : Bs13.313.281

PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE
NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS (NAABOL)

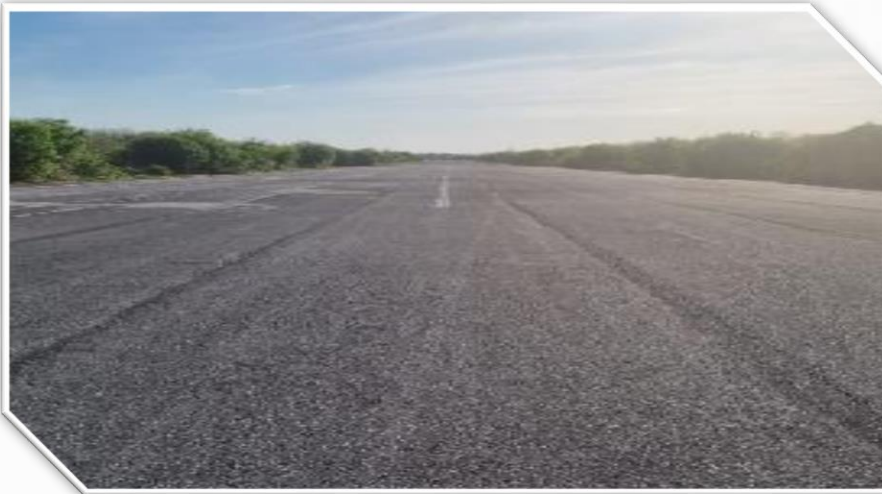

Construcción del Parque Lineal Metropolitano La Paz - El Alto (PLM)

Costo Total del Proyecto :

Bs205.800.000



VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES

Dr. Israel Ticona Castro – Viceministro de Transportes



DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE AÉREO

Mejoramiento y Ampliación del aeropuerto - Cap. Oriel Lea Plaza de la ciudad de Tarija

DETALLES DEL PROYECTO

Costo total del proyecto: **Bs 278.464.159**

Presupuesto 2023: **Bs 5.085.026**

Presupuesto Ejecutado 2023: **Bs 3.425.015**



LOGROS DE GESTIÓN – 2023 PROCESOS DE CONTRATACION

Proceso	Monto Bs	Resultados alcanzados
SUPERVISIÓN TECNICA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE TARIJA "LADO AIRE"	12.416.600,00	SE EMITIÓ LA ORDEN DE PROCEDER A LA SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN TECNICA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE TARIJA.	5.617.476,72	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA SU ENVÍO AL BID
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE LA TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DE TARIJA (LADO TIERRA).	49.315.087,40	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto La Joya Andina de la ciudad de Uyuni-Potosí

DETALLES DEL PROYECTO

Costo total del proyecto: Bs 134.507.841

Presupuesto 2023: Bs 154.108

Presupuesto Ejecutado 2023: Bs 105.805



LOGROS DE GESTIÓN – 2023 PROCESOS DE CONTRATACION

Proceso	Monto Bs	Resultados alcanzados
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y SOCIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL LADO AIRE Y ACCESOS DEL AEROPUERTO LA JOYA ANDINA DE LA CIUDAD DE UYUNI - POTOSÍ	2.700.000,00	ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA LISTA CORTA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y SOCIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA JOYA ANDINA DE LA CIUDAD UYUNI - POTOSÍ	5.000.000,00	INFORME DE LA LISTA CORTA Y EL SDP EN REVISIÓN POR EL BID
CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA DE AERONAVES. MEJORAMIENTO LADO AIRE Y ACCESOS DEL AEROPUERTO " LA JOYA ANDINA" DE LA CUIDAD DE UYUNI - POTOSI.	44.000.000,00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del Proyecto - “Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto de Yacuiba- Tarija”

DETALLES DEL PROYECTO

Costo Total del Proyecto : **Bs 1.274.299**

Presupuesto 2023: **Bs 1.274.299**

Presupuesto Ejecutado 2023: Bs 1.019.439



LOGROS DE GESTIÓN - 2023

RESULTADOS ALCANZADOS

Se cuenta con el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión y el Plan Maestro, en su versión final, estos documentos fueron elaborados dando estricto cumplimiento a la Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB) y Normativas nacionales e internacionales.

Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto de Guayaramerín”

Costo total del proyecto: **Bs 2.245.359**

LOGROS GESTIÓN - 2023

	Proceso	Monto Bs.	Resultados alcanzados
1	ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE GUAYARAMERIN	2.245.359.03	EN PROCESO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS



Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Aeropuerto de Puerto Suarez”

Costo total del proyecto: **Bs 2.580.512**

LOGROS GESTIÓN - 2023

	Proceso	Monto Bs.	Resultados alcanzados
1	ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE PUERTO SUAREZ	2.580.512,00	EN PROCESO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS



Mejoramiento Lado Aire Aeropuerto de Riberalta

DETALLES DEL PROYECTO

Costo total del proyecto: Bs 3.785.604

Presupuesto 2023: Bs 3.750.729

Presupuesto ejecutado 2023: Bs 3.750.729



LOGROS DE GESTIÓN – 2023

- Se ha realizado el mejoramiento con micro pavimento de la plataforma de las calles de rodaje y de la pista de aterrizaje

Mejoramiento Lado Aire del Aeropuerto Guayaramerin

DETALLES DEL PROYECTO

Costo Total del Proyecto: Bs 7.465.135

Presupuesto 2023: Bs 403.426

Presupuesto Ejecutado 2023: Bs 403.426



LOGROS DE GESTIÓN – 2023

- Se realizó el pavimentado de calles de rodaje, pista y plataforma y señalización lado aire.

Obras de Mejoramiento y Emplazamiento en el Aeropuerto de Lampaya (Villazón)

DETALLES DEL PROYECTO

Costo total del proyecto: Bs 16.709.596

Presupuesto 2023: Bs 308.335



LOGROS DE GESTIÓN – 2023 PROCESO DE CONTRATACION

Proceso	Monto Bs.	Resultados alcanzados
SUPERVISIÓN TECNICA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y EMPLAZAMIENTO EN EL AEROPUERTO DE VILLAZON - LAMPAYA"	1.233.338,06	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

Parque Lineal para La Paz y El alto (BO-L1212)

ALCANCE


Construcción de una ciclosenda de 18,24 kilómetros incorporando 7 hitos urbanos con mejoramiento de espacios públicos como plazas, graderías, campos deportivos barriales y espacios urbanos residuales con la mejora integral de 8 áreas verdes, 7 miradores y 7 nuevos nodos urbanos

Costo Total del Proyecto

Bs 205.800.000

Presupuesto 2023

Bs 1.140.830

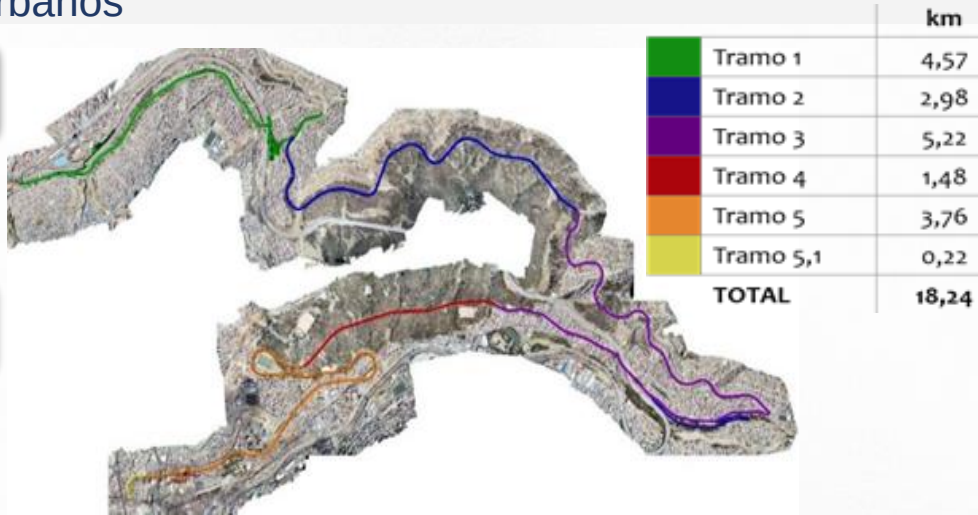

CONSTRUCCION PARQUE LINEAL METROPOLITANO LA PAZ – EL ALTO

Ítem	PROCESO	MONTO Bs	RESULTADOS ALCANZADOS
1	SUPERVISIÓN TÉCNICA SOCIOAMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL METROPOLITANO LA PAZ – EL ALTO" (TRAMOS 1 Y 5)"	3.883.188,14	SE FIRMÓ EL CONTRATO CON LA EMPRESA ADJUDICADA EN FECHA 15/12/2023
2	SUPERVISIÓN TÉCNICA SOCIOAMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL METROPOLITANO LA PAZ – EL ALTO" (TRAMOS 2, 3,Y 4)"	3.218.803,28	SE FIRMÓ EL CONTRATO CON LA EMPRESA ADJUDICADA EN FECHA 18/12/2023
3	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL METROPOLITANO LA PAZ – EL ALTO" (TRAMOS 1 SENDA VERDE)	44.799.999,00	EN PROCESO DE LICITACIÓN EN EL SICOES

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE

UNIDAD TÉCNICA DE FERROCARRILES (UTF)

Const. Tren Metropolitano de Cochabamba

DETALLES DEL PROYECTO

Costo total del proyecto : Bs 3.143.619.351

Presupuesto 2023: Bs 323.308.874

Presupuesto Ejecutado 2023: Bs 199.394.216



MUNICIPIO	NUMERO DE BENEFICIARIOS
Sipe Sipe	41.571
Vinto	51.968
Colcapirhua	51.990
Quillacollo	137.182
Cercado	632.013

RESULTADOS GESTIÓN 2023

- *Se concluyó la construcción de la línea verde - actualmente se encuentra en operación.*
- *Se concluyó de la construcción de la Estación Central, Talleres y Cocheras.*
- *Línea roja y verde se encuentran en operación en sus tramos completos, línea roja amplía su tramo en 2,3 km (Agronomía – Uspha Uspha).*

Construcción de la Línea Amarilla.

No se obtuvo el resultado programado debido a la falta de la licencia ambiental que no fue otorgada por la Gobernación por falta de derecho propietario consolidado en el aeropuerto.

Const. de Obras Via Férrea Montero Buló – Buló

DETALLES DEL PROYECTO

Costo total del proyecto : Bs 2.124.220.717

Presupuesto Inicial 2023: Bs 62.149.028

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs 48.584.284



BENEFICIARIOS

POBLACIÓN POR DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	HABITANTES
Habitantes de Santa Cruz 2.657.762	Santa Rosa Del Sara	19.217
	San Juan De Yapacani	9.191
	Yapacani	50.558
	San Carlos	20.093
	General Saavedra	14.209
	Montero	109.518
Habitantes de Cochabamba 1.762.761	Portachuelo	17.885
	Entre Ríos (Bulo Buló)	31.550

RESULTADOS GESTIÓN 2023

- ✓ Conclusión de Construcción de Obras de Arte Mayor y Menor Vía Férrea Tramo I “Montero - Buló Buló”.
- ✓ Conclusión de infraestructura y super estructura de la vía férrea progresiva 4+190 a la 12+000, con la ejecución del contrato al 100% mediante contrato modificadorio N° 2 se amplió la construcción adicional de 1,03 km, llegando desde la progresiva 4+190 a la progresiva 13+030 teniendo una construcción total de vía férrea de 8,84 km.

Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI)

DETALLES DEL PROYECTO

Costo Total del Proyecto : Bs 20.580.000

Presupuesto 2023: Bs 7.033.162

Presupuesto Ejecutado Final 2023: Bs 10.442.546



BENEFICIARIOS	MUNICIPOS	HABITANTES
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	Chimoré	21.736
	Entre Ríos	31.550
	Puerto Villarroel	46.627
	Shinahota	20.841
	Villa Tunari	71.386

RESULTADOS GESTIÓN 2023

- ✓ Estudio De Diseño Técnico De Preinversión Vía Ferreira Subtramo I “Bulo Bulo – Ivirgarzama – Puerto Villarroel” Entorno Al Corredor Bioceánico (CFBI).
- ✓ Estudio De Diseño Técnico De Preinversión Vía Ferreira Sub Tramo II “Ivirgarzama – Villa Tunari” (CFBI).
- ✓ Supervisión De Consultorías Para El Desarrollo Del Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico De Integración (CFBI).
No se concluyeron los estudios por problemas sociales que impiden el acceso a las zonas de estudio.
- ✓ Se concluyó el Estudio Del Análisis Técnico Y Normativo Para La Interoperabilidad E Interconectividad De Los Sistemas Ferroviarios De Bolivia Y Países Vecinos Entorno Al Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico De Integración (CFBI).

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE

UNIDAD TÉCNICA DE HIDROVÍAS (UTH)

Unidad Técnica de Hidrovías - (UTH)

Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Hidrovía ICHILO - MAMORÉ (Tramo I)

DETALLES DEL PROYECTO

Costo total del proyecto : **Bs31.350.623**

Presupuesto 2023: **Bs13.998.349**

Presupuesto Ejecutado Final 2023: **Bs. 5.806.539**



RESULTADOS GESTIÓN 2023

- ✓ Se ejecutó el pago del Informe Inicial del Estudio registrando un Avance Físico de 5% y un Avance Financiero de 19,54% respecto al monto total del contrato.

Unidad Técnica de Hidrovías - (UTH)

Estudio de Diseño Técnico de Preinversión Hidrovía ICHILO - MAMORÉ (Tramo II)

DETALLES DEL PROYECTO

Costo total del proyecto : Bs 18.155.011

Presupuesto 2023: Bs 20.000

En licitación



RESULTADOS GESTIÓN 2023

- ✓ Se publicó en el SICOES la Primera Convocatoria – Primera Publicación de la Supervisión y el ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PROYECTO HIDROVÍA ICHILO – MAMORÉ, TRAMO II en fecha 27 y 28 de diciembre de 2023 respectivamente, con un precio referencial de Bs.18.155.011,19 para ambos componentes, con Financiamiento de Recursos CAF – PROMULPRE II

UNIDAD DE SERVICIOS A OPERADORES (USO)

Unidad de Servicios de Operadores (USO)

OBJETIVO

Administración del Sistema de Información de Operadores de transporte terrestre de pasajeros y carga; Empresas Constructoras; Consolidadoras y Desconsolidadoras de carga; Operadores de Transporte Multimodal, en cumplimiento a normas y disposiciones en transporte y comercio nacional e internacional.

Presupuesto Programado recaudación Inicial 2023

Bs 11.542.229,41

Registros Programados Inicial 2023

46.000

Tarjetas de Operación Programadas inicial 2023

17.500

Recaudación 2023

Bs 12.133.600,70



Registros Realizados 2023

50.014



Tarjetas de Operación Realizadas 2023

18.640



Tipos de Beneficiarios	Cantidad Programada Inicial 2023	Cantidad Ejecutada 2023
Operadores Internacionales	3.509	3.667
Operadores Nacionales	855	855
Empresas Constructoras	2.631	2.631
TOTAL	6.995	7.444

ORGANISMO SECTORIAL COMPETENTE (OSC)

ADMINISTRADORA TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ (ATTSC)



Administradora Terminal Terrestre Santa Cruz (ATTSC)

OBJETIVO

La Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz, tiene como objetivo prestar el servicio público de terminal terrestre de pasajeros y carga a nivel interdepartamental e internacional.

BENEFICIARIOS

Operadores de Transporte Terrestre Interdepartamental e Internacional, en beneficio de los usuarios.

Ingresos Programado Inicial 2023

Bs 27.352.795

Ingresos Recaudado Final 2023

Bs 27.280.325

Concepto de Recaudación	Ingreso Programado Inicial 2023	Ingreso Percibido 2023
Venta de Servicios	20,762,092	20,779,535
Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos	5,984,052	5,898,982
Otros Ingresos	606,651	601,808
TOTAL	27,352,795	27,280,325

Actividades Realizadas Gestión 2023 (ATTSC)

Mantenimiento del Pintado de la Fachada de la ATTSC : Bs. 327.350,57 (Trescientos Veintisiete Mil Trescientos Cincuenta con 57/100 Bolivianos)



Mantenimiento y Cambio de Cubierta del Módulo departamental de la ATTSC Sector Norte : Bs. 125.997,44 (Ciento Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Siete con 44/100 bolivianos)



Actividades Realizadas Gestión 2023 (ATTSC)

Limpieza y desmonte de áreas internas de la ATTSC : Bs204.068,37 (Doscientos Cuatro Mil Sesenta y ocho con 37/100 bolivianos)



Mantenimiento y refacción de cubierta de alfa 2 de la ATTSC : Bs53.303,92 (Cincuenta y Tres Mil Trescientos Tres con 92/100 bolivianos)



Actividades Realizadas Gestión 2023 (ATTSC)

Mantenimiento y refacción de pavimento de la ATTSC : Bs790.748,04 (Setecientos Noventa Mil Setecientos Cuarenta y Ocho con 04/100 bolivianos)



Mantenimiento y refacción : Bs187.831,12 (Ciento Ochenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Uno con 12/100 Bolivianos)



Actividades Realizadas Gestión 2023 (ATTSC)

Mantenimiento y refacción de muro y malla perimetral del frontis de la ATTSC : Bs137.085,85 (Ciento Treinta y Siete Mil Ochenta y Cinco con 85/100 bolivianos)



Mantenimiento y refacción de del muro perimetral de la ATTSC entre alfa 1 y 9 : Bs185.565,06 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cinco con 06/100 bolivianos)



OPERADORA DEL TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA – MI TREN



LOGROS OBTENIDOS POR – MI TREN

HABILITACION DE NUEVOS TRAMOS DE LA LINEA VERDE

TRAMOS HABILITADOS LINEA VERDE		Distancia en Km	Gestión
TRAMO 1	Estacion Central - Estacion Quillacollo	14	2023
TRAMO 2	Estación Quillacollo - Estación Vinto	4	2023
TRAMO 3	Estación Vinto - Estación Suticollo	8,6	2023
TOTAL DISTANCIA		26,6	



LOGROS OBTENIDOS POR – MI TREN

INGRESOS ECONOMICOS - GESTION 2023



DESCRIPCIÓN	MONTO (BS)
ALQUILER DE AMBIENTES – AREAS COMERCIALES	Bs 748,226.94
TRANSPORTE DE PASAJEROS (USUARIOS)	Bs 3,536,817,00
TOTAL INGRESO (BS)	Bs 4,285,043.94

CANTIDAD PASAJEROS TRANSPORTADOS LINEA ROJA Y VERDE			
PASAJEROS TRANSPORTADOS	LINEA ROJA	LINEA VERDE	TOTAL
	231,296	1,092,084.00	1,388,167.00

LINEA ROJA

LINEA ROJA - EXPRESADO EN USUARIOS

DÍA	FECHA	General	Preferencial	Usuarios (Boletos)
ENERO	31/1/2023	40972	16429	57401
FEBRERO	28/2/2023	12053	4478	16531
MARZO	30/3/2023	10105	4625	14730
ABRIL	30/4/2023	14558	7018	21576
MAYO	31/5/2023	9187	5082	14269
JUNIO	30/6/2023	7949	4672	12621
JULIO	31/7/2023	18102	8473	26575
AGOSTO	30/8/2023	5900	3488	9388
SEPTIEMBRE	30/9/2023	6423	11049	17472
OCTUBRE	31/10/2023	5995	8201	14196
NOVIEMBRE	30/11/2023	5859	7752	13611
DICIEMBRE	31/12/2023	8911	3975	12886
TOTAL		146014	85242	231256

LINEA ROJA – EXPRESADO EN BOLIVIANOS

DÍA	FECHA	General	Preferencial	TOTAL EFECTIVO (BOLIVIANOS)
ENERO	31/1/2023	139240,5	32042	171282,5
FEBRERO	28/2/2023	42185,5	8956	51141,5
MARZO	30/3/2023	33241,5	8995	42236,5
ABRIL	30/4/2023	42223	11974	54197
MAYO	31/5/2023	27191,5	8963	36154,5
JUNIO	30/6/2023	24175,5	8175	32350,5
JULIO	31/7/2023	58823	15417	74240
AGOSTO	30/8/2023	18433	5983	24416
SEPTIEMBRE	30/9/2023	20379,5	13074	33453,5
OCTUBRE	31/10/2023	18881,5	10588	29469,5
NOVIEMBRE	30/11/2023	18391,5	10099	28490,5
DICIEMBRE	31/12/2023	27984,5	7364	35348,5
TOTAL		471150,5	141630	612780,5

LINEA VERDE

LINEA VERDE-PERIDO 2023 EXPRESADO EN USUARIOS

DÍA	FECHA	General	Preferencial	Usuarios (Boletos)
FEBRERO	28/2/2023	5779	3069	8848
MARZO	30/3/2023	15262	8109	23371
ABRIL	30/4/2023	15743	25196	40939
MAYO	31/5/2023	23430	24770	48200
JUNIO	30/6/2023	31161	18547	49708
JULIO	31/7/2023	75254	38849	114103
AGOSTO	30/8/2023	76563	47998	124561
SEPTIEMBRE	30/9/2023	97569	50204	147773
OCTUBRE	31/10/2023	103203	48832	152035
NOVIEMBRE	30/11/2023	93253	61269	154522
DICEMBRE	31/12/2023	152539	75485	228024
TOTAL		689756	402328	1092084

LINEA VERDE - PERIDO 2023 EXPRESADO EN BOLIVIANOS

DÍA	FECHA	General(bolivianos)	Preferencial(Bolivianos)	TOTAL EFECTIVO(BOLIVIANOS)
FEBRERO	28/2/2023	23116	6138	29254
MARZO	30/3/2023	52344	15375	67719
ABRIL	30/4/2023	57826	40945	98771
MAYO	31/5/2023	81392	42503	123895
JUNIO	30/6/2023	108748	33879	142627
JULIO	31/7/2023	266538	71787	338325
AGOSTO	30/8/2023	230050	83540	313590
SEPTIEMBRE	30/9/2023	282768	77211	359979
OCTUBRE	31/10/2023	317800	88437	406237
NOVIEMBRE	30/11/2023	316136	123929	440065
DICEMBRE	31/12/2023	511725,5	144160	655885,5
TOTAL		2248443,5	727904	2976347,5

LIQUIDADORA DE ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA (L-AASANA)



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – LIQUIDADORA DE AASANA 2023

OBJETIVO

Realizar actividades referidas al cese de operaciones y liquidación de AASANA.
Generando procesos administrativos y legales que coadyuven a la gestión de Pago de Obligaciones y Cobro de Acreencias.

	Presupuesto - 2023	Ejecución - 2023	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
RECURSOS TGN	Bs 2.060.179	Bs 2.150.379,01	104%
RECURSOS TRANSFERENCIAS NAABOL	Bs 6.000.000	Bs 13.556.248	226%

Resultado de Gestión 2023

PROCESOS LEGALES EN NUMERO DE CASOS

PROCESOS	PROCESOS RECIBIDOS	GANADO, RESUELTO O PERDIDO	EN TRAMITE	INTERPRETACION	ENTRAMITE Bs
CIVIL	4		4	EN CALIDAD DE DEMANDADO ESPERANDO NOTIFICACIÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD PROCESAL	
PENAL	21	2	19	SE ENCUENTRAN EN PROCESO EN DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES	9.966.322,44
LABORAL	91	19	72	SE ENCUENTRAN EN PROCESO EN DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES	20.713.356,52
COACTIVO	116	5	111	SE ENCUENTRAN EN PROCESO EN DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES	12.663.804,57
CONTENCIOSO TRIBUTARIO	1		1	EN CALIDAD DE DEMANDADO ESPERANDO NOTIFICACIÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD PROCESAL	
CONSTITUCIONAL	4	2	2	SE ENCUENTRAN EN PROCESO EN DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES	44.447,73
ENTE GESTOR DE SALUD	49		49	PROCESO ADMINISTRATIVO Y LEGALES EN LA CAJA NACIONAL DE SALUD, POR OMISION DE PAGOS	16.132.928,39
GESTORA PÚBLICA	9		9	PROCESO ADMINISTRATIVO Y LEGALES, ADMINISTRACION DE FONDO DE PENSIONES, ETAPA DE CONCILIACIÓN	
ADMINISTRACIÓN ADUANERA	10	10	0	PROCESO ADMINISTRATIVO EXENCIÓN TRIBUTARIA DE IMPORTACIÓN, CONCLUIDOS Y EXONERADOS	10.861.954,00
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	150		150	PROCESO ADMINISTRATIVO Y LEGALES POR TRIBUTOS FISCALES OMITIDOS REGIONAL SANTA CRUZ (APROXIMADAMENTE)	480.000.000,00
TOTAL	455	38	417		550.382.813,65

- Exoneración de tributos aduaneros de 10 procesos de importación por Bs 10.861.954
- Conciliación y Pago al Servicio de Impuestos Nacionales por Bs 9.146.139
- Trámite de mas de 455 procesos legales en curso a nivel nacional de forma preliminar en mas de una gestión del proceso de liquidación.
- Ampliación de vigencia D.S. 5075 hasta el 01/12/2024

ENTIDADES BAJO TUICIÓN

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS



PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS E INVERSIONES 2023

GESTION 2023	PROGRAMADO INICIAL	RESULTADO FINAL	%
KILÓMETROS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS, TÚNELES Y OTROS	477	536,84	113%
KILÓMETROS REHABILITADOS DE CARRETERAS, TÚNELES Y OTROS	93	42,89	46%
KILÓMETROS ANUALES CONSERVADOS DE CARRETERAS, PUENTES, TÚNELES Y OTROS	12.804	12.551	98%

PROGRAMA	N° DE PROYECTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	% EJECUCION PRESUPUESTO VIGENTE 2023
CONSTRUCCIÓN	60	4.246.399.649	4.271.775.985	1.468.344.975	27,36%
REHABILITACIÓN	7	242.433.240	471.824.766	385.938.490	7,19%
CONSERVACIÓN	78	372.444.846	562.343.758	520.056.097	9,69%
PREINVERSIÓN	15	39.715.529	60.306.839	15.445.380	0,29%
TOTAL	160	4.900.993.264	5.366.251.348	2.389.784.942	45%

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2023 POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	PRESUPUESTO FINAL EJECUTADO 2023	% PRESUPUESTO EJECUTADO VIGENTE 2023
PROGRAMA	1.928.652.655	1.165.430.102	0	0,00%
SANTA CRUZ	1.285.730.930	1.347.098.903	1.003.632.958	18,70%
LA PAZ	544.777.987	651.461.654	191.060.862	3,56%
PANDO	312.130.159	321.711.468	49.814.791	0,93%
COCHABAMBA	285.367.702	707.330.980	218.019.198	4,06%
CHUQUISACA	250.246.348	357.939.957	252.765.369	4,71%
TARIJA	123.519.796	163.214.306	120.566.018	2,25%
BENI	97.390.043	544.723.933	483.447.286	9,01%
POTOSI	39.673.549	48.820.758	40.180.091	0,75%
ORURO	33.504.095	58.519.287	30.298.368	0,56%
TOTAL	4.900.993.264	5.366.251.348	2.389.784.942	45%

PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA GESTIÓN 2023

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O TRAMO	DPTO.	KM.	INVERSIÓN PROGRAMADA (Bs.)	INVERSIÓN EJECUTADA (Bs.)
1	CONST. DOBLE VÍA HUARINA-TIQUINA	LA PAZ	25,00	4.878.343	3.645.158
2	CONST. DOBLE VIA TRAMO CENTRAL "EL SILLAR"	COCHABAMBA	29,14	118.103.003	67.526.019
3	CONST. CARRETERA EL ESPINO-CHARAGUA-BOYUIBE	SANTA CRUZ	159,39	105.184.632	105.184.632
4	CONST. CARRETERA SAN BORJA-SAN IGNACIO DE MOXOS	SANTA CRUZ	139,60	76.358.673	75.262.482
5	REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA: TRAMO II: MATARAL-MAIRANA.	SANTA CRUZ	50,25	27.182.073	25.307.469
6	REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA: TRAMO III: MAIRANA – BERMEJO	SANTA CRUZ	58,24	86.565.277	78.619.707
7	CONST. CARRETERA IXIAMAS – SAN BUENAVENTURA (22 PUENTES)	LA PAZ	1,83	48.559.944	43.278.221
8	CONST. CARRETERA UYUNI - ATOCHA - TUPIZA. TRAMO I: UYUNI - ATOCHA; TRAMO II: ATOCHA – TUPIZA.	POTOSI	90,40	0	187.837
			97,90	0	8.449.168
9	CONST. CARRETERA ZUDAÑEZ – PADILLA – MONTEAGUDO – IPATI	CHUQUISACA	44,86	0	5.759.633
TOTAL				466.831.945	413.220.326

CONSTRUCCIÓN DOBLE VÍA HUARINA – TIQUINA FASE I (25KM)

CONTRATISTA: A.A. GRUPO EMPRESARIAL DE INV. EN CONST. GEICO

DESCRIPCIÓN

Esta doble vía, garantiza la transitabilidad que comunica a las poblaciones de San Pedro de Tiquina y Huarina con las poblaciones de Achacachi, Chua Cocani, Huatajata y otras menores.

- La Carretera en su PRIMERA FASE corresponde a un Tramo de 25,00 Km
- Se tiene **TODA** la obra concluida con **Entrega Definitiva**.
- Se esta gestionando financiamiento para la fase 2 del proyecto (hasta llegar a Tiquina completando los 38,15 km).

MONTO 2023

Bs. 4.878.343,08

MONTO EJECUTADO 2023

Bs. 3.645.158,16

KM INICIAL 2023

38,15 km

KM FINAL 2023

25 km



CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CENTRAL DOBLE VÍA “EL SILLAR” CARRETERA COCHABAMBA – SANTA CRUZ (LLAVE EN MANO CON MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO GESTIONADO POR EL PROPONENTE Y CONDICIÓN SUSPENSIVA CONTRATISTA: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL BOLIVIA

DESCRIPCIÓN

La doble vía Tramo Central El Sillar, forma parte del corredor Bioceánico y consolida una principal ruta de vinculación nacional. Garantiza la transitabilidad que comunica a la población de Villa Tunari con las poblaciones de Shinahota, Colomi y otras menores.

- Se cuenta con Recepción Provisional el 23 de noviembre 2023.
- **SE VIENE ATENDIENDO LOS SITIOS DE EMERGENCIA EN LOS KM. 105 y 108**

MONTO 2023

Bs. 118.103.002,56

KM INICIAL 2023

28,72 km

MONTO EJECUTADO 2023

Bs. 67.526.019,10

KM FINAL 2023

29,14 Km



DISEÑO (READECUACIÓN), CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CARRETERA EL ESPINO - CHARAGUA – BOYUIBE

CONTRATISTA: CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

DESCRIPCIÓN

La carretera forma parte del corredor Norte – Sur, Garantiza la transitabilidad que comunica a las poblaciones de Charagua y Boyuibe con las poblaciones de Cabezas, Macharetí, y otras menores.

- Concluida al 100% y en actual servicio, con Entrega Definitiva.

MONTO 2023

Bs. 105.184.632,38

MONTO EJECUTADO 2023

Bs. 105.184.632,38

KM INICIAL 2023

159,39 km

KM FINAL 2023

159,39 km



CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN BORJA – SAN IGNACIO DE MOXOS

CONTRATISTA: ASOCIACION ACCIDENTAL CCCC

DESCRIPCIÓN

La carretera forma parte del corredor Oeste – Norte, Garantiza la transitabilidad que comunica a las poblaciones de San Borja, Santa Ana de Yucuma y San Ignacio de Moxos con las poblaciones de Trinidad, Rurrenabaque, Palos Blancos, y otras menores.

- La ABC gestionó ante la CAF y las nuevas Autoridades de la Gobernación del Beni el cumplimiento del convenio intergubernativo para el cumplimiento de los desembolsos de Aporte Local.
- El proyecto está con Entrega Definitiva.

MONTO 2023

Bs. 76.358.673,05

KM INICIAL 2023

139,60 km

MONTO EJECUTADO 2023

Bs. 75.262.482,22

KM FINAL 2023

139,60km



OBRAS DE REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA – COMARAPA. TRAMO II: MATARAL - MAIRANA

CONTRATISTA: COCONAL SAPI DE CV

DESCRIPCIÓN

El sub tramo II MATARAL - MAIRANA, de **50,27 KM**, a través de los Municipios de Comarapa, Pampa Grande, Mairana.
El proyecto presenta una rehabilitación en todo el tramo con reciclado del pavimento antiguo y carretera asfáltica nueva de 9cm de espesor a lo largo del Tramo.

- Se encuentra concluida al 100%
- El Proyecto se encuentra en fase de mantenimiento por estándares.

MONTO 2023

Bs. 27.182.072,68

KM INICIAL 2023

50,25 km

MONTO EJECUTADO 2023

Bs. 25.307.469,31

KM FINAL 2023

50,25 km



OBRAS DE REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA – COMARAPA. TRAMO III: MAIRANA - BERMEJO

CONTRATISTA: CALZADA CONSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN

La rehabilitación del tramo carretero Mairana – Bermejo, Garantiza la transitabilidad que comunica a las poblaciones de Mairana y Samaipata con las poblaciones de Bermejo El Torno, Pampa Grande y otras menores.

- Se encuentra concluido al 100%
- El proyecto se encuentra en fase de mantenimiento por estándares.

MONTO 2023

Bs. 86.565.277,17

KM INICIAL 2023

58,24 km

MONTO EJECUTADO 2023

Bs. 78.619.707,01

KM FINAL 2023

58,24 km



**CONST. CARRETERA IXIAMAS - SAN BUENAVENTURA
(CONSTRUCCION DE PUENTES IXIAMAS – TUMUPASA – SAN BUENAVENTURA – LOTES 1A, 1B, 2A y 2B)**

**CONTRATISTA: ASOC. ACC. AMAZONIA (LOTE 1A), LEVON S.A. SUCURSAL BOLIVIA (LOTE 1B), CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. (LOTE 2A) y
EMPRESA CONSTRUCTORA EL CEIBO S.R.L. (LOTE 2B)**

DESCRIPCIÓN

Consiste en la ejecución de 22 puentes, que sumados hacen una longitud de 1,90 Km.

- Se tiene TODA la obra concluida con Entrega Definitiva.

MONTO 2023

Bs. 48.559.943,77

MONTO EJECUTADO 2023

Bs. 43.278.221,14

KM INICIAL 2023

1,90 km

KM FINAL 2023

1,83 km



CARRETERA MONTEAGUDO IPATI, TRAMO II MUYUPAMPA - IPATI

DESCRIPCIÓN

Proyecto fue concluido físicamente, se efectuó la Recepción Provisional

MONTO 2023

Bs. 81.499.732,73

MONTO EJECUTADO 2023

Bs. 55.759.632,67

KM INICIAL 2023

46.08 km

KM FINAL 2023

44.86 km



CONSTRUCCIÓN CARRETERA UYUNI-TUPIZA TRAMO I: UYUNI-PK 90+400 TRAMO II: PK 90+400-TUPIZA

CONTRATISTA: ASOCIACION ACCIDENTAL SANTA FE

SUPERVISIÓN: ASOCIACION ACCIDENTAL DEL SUR

DESCRIPCIÓN

- Tramo I: Transferido a Conservación Vial (agosto/2023).
- Tramo II: Recepción Definitiva 09 y 10 de agosto de 2023
- Se gestionara recursos adicionales para atender necesidades en el *proyecto*.
- Se gestionara ante Vías Bolivia la priorización de la construcción de las 3 Estaciones de pesaje previstas para el proyecto "Noel Mariaca (31 + 100), Atocha (90 + 400) y Salo (163+400)".

MONTO 2023

TRAMO I: 1.202.405,11
TRAMO II: 8.482.111,64

MONTO EJECUTADO 2023

TRAMO I: 187.836,88
TRAMO II: 8.449.168,08

KM INICIAL 2023

90,40 km
97,90 km

KM FINAL 2023

90,40 km
97,90 km



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL



Proyectos en Ejecución en la Gestión 2023

No.	Proyecto	Contratante	Fecha Suscripción Contrato	Fecha Orden de Inicio	Fecha Entrega Provisional	Valor Contrato (Bs).	% Ejecución Física a Dic. 2023	% Ejecución Financiera 2023	Estado
1	Construcción de la Carretera Monteagudo - Muyupampa Ipati	ABC	07/01/2015	02/05/2019	20/12/2023	180.503.613	100%	91,41%	Entrega Provisional
2	Construcción Doble Vía Yacuiba - Campo Pajoso (*)	ABC	09/08/2019	10/08/2019	7/01/2024	122.334.506	82,15%	79,96%	En Ejecución
3	Construcción Carretero Villa Montes – La Vertiente - Palo Marcado	ABC	12/09/2019	18/09/2019	12/04/2024	106.631.001	76,44%	76,00%	En Ejecución
4	Construcción Planta de Almacenamiento de Granos de EMAPA (**)	EMAPA	15/02/2022	25/03/2022	31/01/2024	79.467.272	51,31%	60,57%	En Ejecución
5	Obras Complementarias de Emergencia y Mantenimiento Villa Tunari - Ichilo	ABC	06/10/2022	24/10/2022	26/01/2024	15.133.132	75,92%	73,53%	En Ejecución
6	Construcción Carretera El Sena	ABC	07/11/2022	24/11/2022	14/02/2024	59.244.303	59,88%	69,11%	En Ejecución
7	Construcción Pavimento Rígido Senda B Calaminas (Tramo 1) Chimoré	MOPSV	17/07/2023	11/08/2023	22/03/2024	13.388.556	7,90%	7,34%	En Ejecución

(*) Proyecto en trámite de ampliación de alcance, monto y plazo Contractual.

(**) Proyecto sujeto a ampliación de plazo por la Actualización del EDTP .

Proyectos Ejecutados en la Gestión 2023

No.	Proyecto	Contratante	Fecha Suscripción Contrato	Fecha Orden de Inicio	Fecha Entrega Provisional	Valor Contrato (Bs).	% Ejecución Física a Nov. 2023	Estado
1	Conservación Vial San Ignacio - Monte Grande del Apere	ABC	03/12/2018	04/12/2018	06/08/2023	94.811.354	100%	Concluido
2	Mejora de Vías Urbanas en el Municipio de Chimoré - Av. Los Pinos	GAM Chimoré	18/08/2022	05/09/2022	20/05/2023	6.889.211	100%	Concluido
3	Construcción Aeropuerto de Rurrenabaque – NAABOL	NAABOL	05/08/2022	24/09/2022	23/07/2023	6.360.000	100%	Concluido
4	Obras para el Mejoramiento Aeropuerto de Riberalta	MOPSV	07/11/2022	22/11/2022	1/04/2023	3.410.604	100%	Concluido
5	Construcción del acceso vehicular y peatonal al CMNYR La Paz (Achumani)	ABEN	12/05/2023	15/05/2023	13/08/2023	2.020.007	100%	Concluido
6	Servicio de Mantenimiento y refacción Parlamento UNASUR	MOPSV	17/07/2023	11/08/2023	06/02/2024	1.815.962	100%	Concluido

VÍAS BOLIVIA

ADMINISTRADORA DE PEAJE Y PESAJE



PRESUPUESTO VÍAS BOLIVIA GESTIÓN 2023


PRESUPUESTO TOTAL GESTIÓN 2023	INICIAL 2023 Bs	FINAL 2023 Bs.
Gasto Corriente	706.306.190	666.084.892

94,31%



RECAUDACIÓN COBRO DE PEAJE

MES	PROGRAMADO	RECAUDADO **
ENERO	54.300.554	47.471.789
FEBRERO	50.963.775	47.298.561
MARZO	57.687.096	54.453.944
ABRIL	57.926.637	55.187.605
MAYO	56.896.097	54.815.938
JUNIO	56.742.199	53.843.239
JULIO	62.972.002	60.912.918
AGOSTO	58.171.104	58.449.222
SEPTIEMBRE	57.974.396	56.547.930
OCTUBRE	60.742.969	59.592.765
NOVIEMBRE	53.819.447	57.322.839
DICIEMBRE	61.071.801	54.852.603
TOTAL	689.268.077	660.749.353

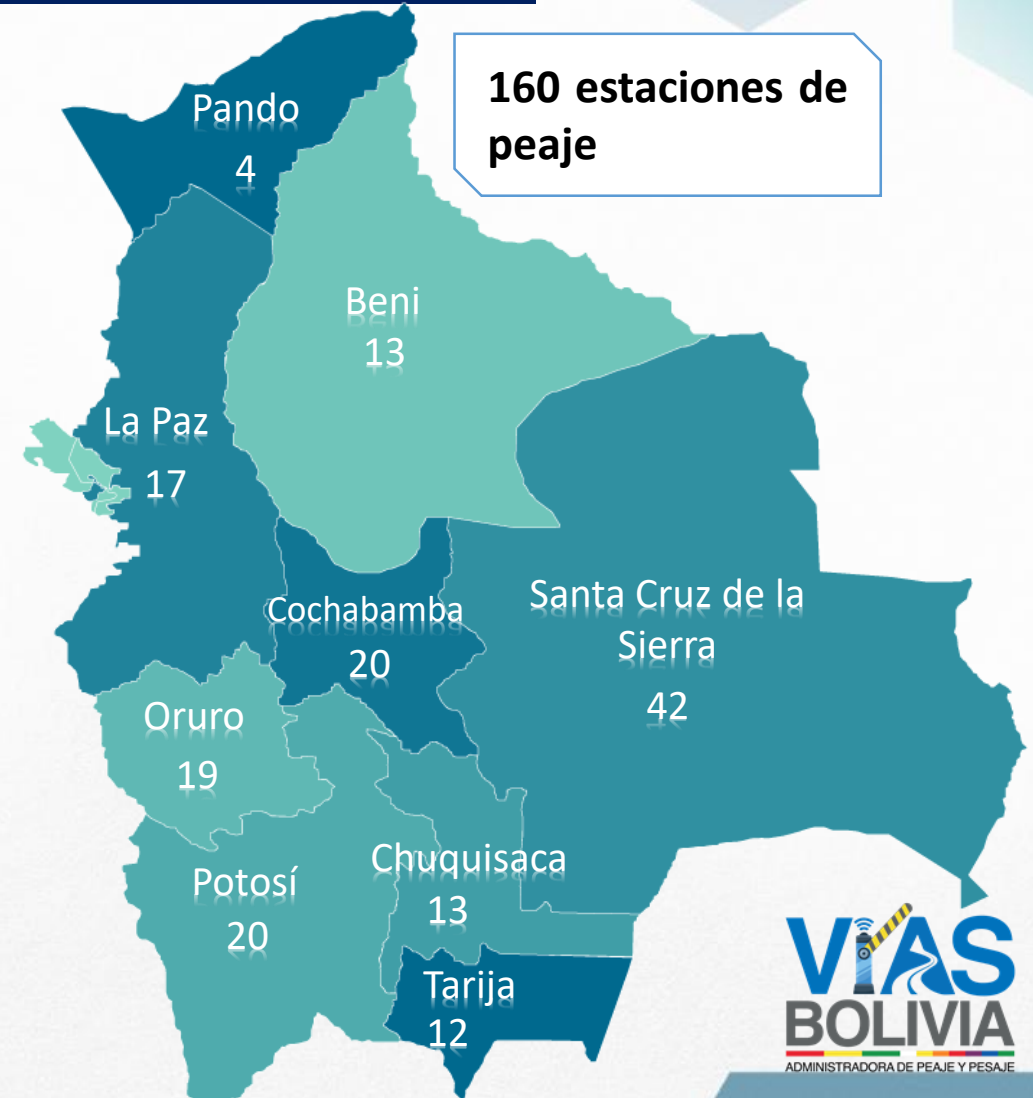

EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE “MI TELEFÉRICO”



Mi Teleférico
SUPERANDO LÍMITES


PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL DE LA EETC MT 2023

NIVEL	CÓD. POA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	PLANIFICACIÓN ANUAL GESTIÓN 2023		RESULTADO
				TOTAL ANUAL	TOTAL EJECUTADO	
ACP	1	Transportar 87 millones de vidas y recaudar 257 millones de bolivianos velando por la sostenibilidad empresarial en la gestión 2023	# Vidas Transportados	87.231.247	73.317.673	Se ha alcanzado el 84% respecto a la programación inicial
			Bs. Recaudados	257.821.105	207.417.526	Se ha logrado el 80% de la programación inicial
ACP	2	Diseñar y ejecutar 2 Proyectos de Movilidad Urbana y 2 Proyectos de Fortalecimiento Empresarial que contribuyen a la solución de la Movilidad Urbana en la gestión 2023	# Proyectos de Movilidad Urbana	2	3	Se ha presentado el ITCP de la Línea Café Sección II, así como la ejecución de los proyectos de la Fase II y Teleférico de Oruro
			# Proyectos de Fortalecimiento Empresarial	1	1	La ejecución Financiera del Parque de las Culturas y de la Madre Tierra
			Ejecución Financiera	9.329.954	7.544.295	Se ha ejecutado el 80% de la inversión pública respecto de la programación inicial

* Principales ACP del POA 2023 de la EETC-MT

Ejecución Presupuestaria de Gasto Al 31 de diciembre de 2023 (Expresado en bolivianos)

Tipo de gasto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Total Ejecutado	% ejecución al Presupuesto Vigente
Gasto Corriente	282.181.131	282.524.718	238.899.571	85%
Inversión Pública	9.329.954	11.878.693	7.544.295	64%
Totales	291.511.085	294.403.411	246.443.867	84%

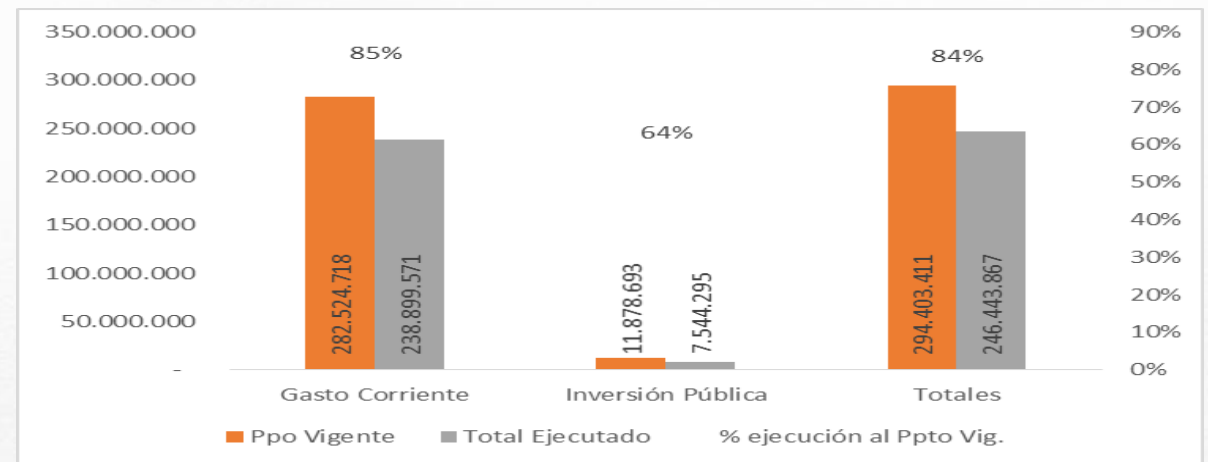

EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES ENFE



Resultado de Gestión 2023

Presupuesto Programado

Bs 7.187.539,00

Presupuesto Ejecutado

Bs 3.991.754,22

Cumplimiento Presupuestario

55,54%



Resultado de Gestión 2023

Principales Logros

1. El 4 de agosto de 2023 al 18 de diciembre de 2023 se da por concluido el proceso de desvinculación de las áreas operativas administradas por la FCA SA.
2. Se procedió a realizar la inventariación de todo el MATERIAL FERREO (comprende rieles, durmientes, eclisas, cambios de vía, etc.), del tramo SUTICOLLO hasta USPHA USPHA, una longitud aproximada de 35 km.
3. Firma del CONVENIO entre ENFE y el MOPSV, para la implementación del Parque Lineal Metropolitano en las ciudades de La Paz y El Alto.
4. En cumplimiento a la Ley 1509 para operativizar la transferencia del bien inmueble que atraviesa la Línea Férrea, incluido el Derecho de Vía entre las zonas el Tejar-Estadio Patria-Barrio Petrolero-Barrio Japón-Khora Khora y Ckochis al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, se inscribió el Derecho Propietario a nombre de ENFE.



NAVEGACIÓN AÉREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS



Gasto corriente e inversión Gestión 2023

Presupuesto Programado:
Bs 528.713.698

PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DEVENGADO ACUMULADO	%
INVERSIÓN	126.903.842	107.892.655	85%
GASTO CORRIENTE	455.911.568	415.243.426	91%
TOTAL	582.815.410	523.136.082	90%

Recaudación Programada: Bs 426.000.000

Recaudación Final: Bs 572.259.839

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE RURRENABAQUE

Costo total del proyecto : **Bs 96.174.051**

Presupuesto 2023 : **Bs 31.942.492**

Presupuesto Modificado : **Bs 35.303.502**

Presupuesto Ejecutado 2023 : Bs 34.773.164

RESULTADOS GESTIÓN 2023

- ✓ Conclusión del las obras, segunda fase del mejoramiento del aeropuerto de Rurrenabaque.
- ✓ Conclusión de las adquisiciones para el equipamiento y pagos por equipamiento.
- ✓ Gestión administrativa del proyecto.



PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN PUENTE DE ABORDAJE AEROPUERTO DE ALCANTARÍ

Costo total del proyecto : Bs 8.838.791,42

Presupuesto Inicial 2023 : Bs 7.282.118

Presupuesto Modificado: Bs 7.060.610

Presupuesto Ejecutado 2023 : Bs. 5.997.054

RESULTADOS GESTIÓN 2023

- ✓ Implementación del puente de abordaje en el aeropuerto de Alcantarí.



PROYECTOS REALIZADOS GESTIÓN 2023

PROYECTO: ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO AVSEC (EN LOS AEROPUERTOS DE EL ALTO, WILSTERMAN Y VIRU VIRU)



Costo total del proyecto : Bs 12.999.700

Presupuesto inicial 2023 : Bs 13.324.500

Presupuesto Modificado: Bs 13.324.500

**PRESUPUESTO Ejecutado 2023:
Bs. 12.999.700**

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

- ✓ Adquisición de los equipos de seguridad aeroportuaria.
- ✓ Recepción e instalación de los equipos de inspección
- ✓ Proyecto concluido, equipamiento entregado y en funcionamiento

PROYECTO: MEJORAMIENTO AEROPUERTO DE PUERTO SUAREZ



Costo total del proyecto : Bs 13.313.281

Presupuesto inicial 2023 : Bs 7.097.395

Presupuesto Modificado : Bs 4.177.786

**PRESUPUESTO Ejecutado 2023:
Bs. 3.225.935**

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

- ✓ Avance del proyecto de construcción en la gestión 2023 corresponde al 77%

PROYECTOS REALIZADOS GESTIÓN 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE CARGA DEL AEROPUERTO DE EL ALTO



Costo total del proyecto :
Bs 5.413.649

Presupuesto Inicial 2023 :
Bs 5.413.649

PRESUPUESTO Ejecutado 2023:
Bs. 1.856.717

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

Implementación del Área de Carga del
Aeropuerto de El Alto

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE CARGA DEL AEROPUERTO DE JORGE WILSTERMANN



Costo total del proyecto :
Bs 5.665.051

Presupuesto Inicial 2023 :
Bs 5.665.051

Presupuesto Modificado:
Bs 5.665.051

PRESUPUESTO Ejecutado 2023:
Bs. 5.474.960

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

Implementación del Área de Carga del
Aeropuerto Jorge Wilstermann.

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE CARGA DEL AEROPUERTO VIRU VIRU



Costo total del proyecto :
Bs 7.477.057

Presupuesto Inicial 2023 :
Bs 7.477.057

Presupuesto Modificado:
Bs 7.477.057

PRESUPUESTO Ejecutado 2023:
Bs. 7.062.676

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

Implementación del Área de Carga del
Aeropuerto Viru Viru

PROYECTOS REALIZADOS GESTIÓN 2023

**PROYECTO: PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADORES Y
GENERADOR MÓVIL DIESEL DE
500KVA AEROPUERTO
INTERNACIONAL VIRU VIRU**



**Costo total del proyecto :
Bs 2.410.366,60**

**Presupuesto Inicial 2023 :
Bs 2.825.956**

**Presupuesto Modificado:
Bs 2.825.956**

**PRESUPUESTO EJECUTADO 2023:
Bs. 2.410.366,60**

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

Transformadores instalados y en funcionamiento en el Aeropuerto Viru Viru

**PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
VÍAS, CALLES DE RODAJE Y
PLATAFORMA VIRU VIRU**



**Costo total del proyecto :
Bs 4.216.326**

**Presupuesto Inicial 2023 :
Bs 4.216.326**

**PRESUPUESTO EJECUTADO 2023:
Bs. 3.767.473**

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

Mejora de vías, calles de rodaje y plataforma del Aeropuerto de Viru Viru concluida.

**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN NUEVA
TORRE DE CONTROL, BLOQUE
TÉCNICO Y SALA DE MAQUINAS
AEROPUERTO DE RIBERALTA**



**Costo total del proyecto :
Bs 4.741.965**

**Presupuesto Inicial 2023 :
Bs 4.741.965**

**PRESUPUESTO EJECUTADO 2023:
Bs. 4.349.675**

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

Avance del proyecto de construcción al 100%

PROYECTOS REALIZADOS GESTIÓN 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE WILSTERMANN 2022



Costo total del proyecto :
Bs 3.316.512

Presupuesto 2023 :
Bs 3.316.512

Presupuesto Modificado:
Bs 3.316.512

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023:
Bs. 3.316.512

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

Conclusión de la mejora del lado aire del Aeropuerto Jorge Wilstermann.

PROYECTO: MEJORAMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO



Costo total del proyecto :
Bs 690.000


Presupuesto Inicial 2023 :
Bs 690.000

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023:
Bs. 662.400

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

Estudio de Diseño Técnico y Preinversión concluido.

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA, PASILLO Y PUENTE DE ABORDAJE, AEROPUERTO INTERNACIONAL

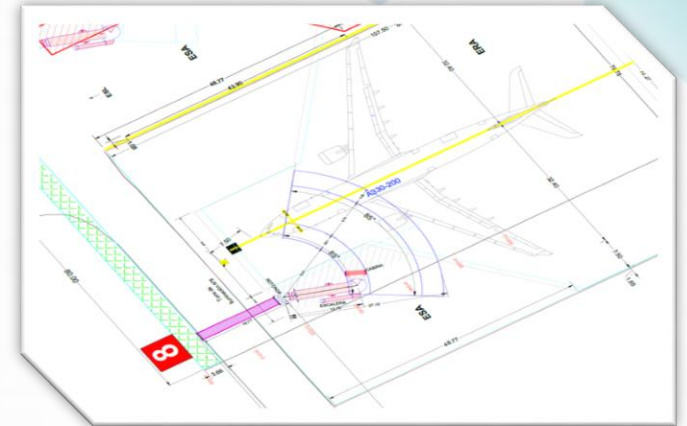

Costo total del proyecto :
Bs 20.477.738,96

Presupuesto Inicial 2023 :
Bs 6.244.700

Presupuesto Modificado:
Bs 6.244.700

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023:
Bs. 3.250.755


RESULTADOS GESTIÓN 2023:

*Mejorará el tiempo de repostaje de las aeronaves y transbordo de pasajeros de las aeronaves a la terminal PAX y viceversa.

*Mayor confort para los pasajeros.

PROYECTOS REALIZADOS GESTIÓN 2023

PROYECTO: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS CATEGORÍA I DEL AEROPUERTO “JORGE

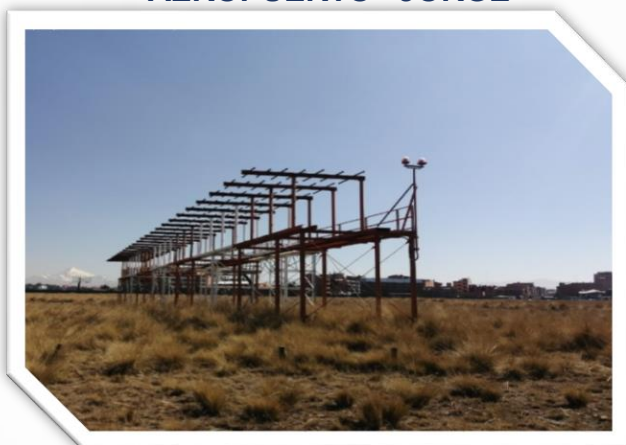

Costo total del proyecto :
Bs 9.220.258

Presupuesto Inicial 2023 :
Bs 11.136.000


Presupuesto Modificado:
Bs 9.220.258

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023:
Bs. 5.909.341

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

Proyecto de Equipamiento y actualización de Sistemas, en ejecución normal con un avance físico del 70%.

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA AMHS “SISTEMA DE MANEJO DE MENSAJES AERONÁUTICOS” AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL

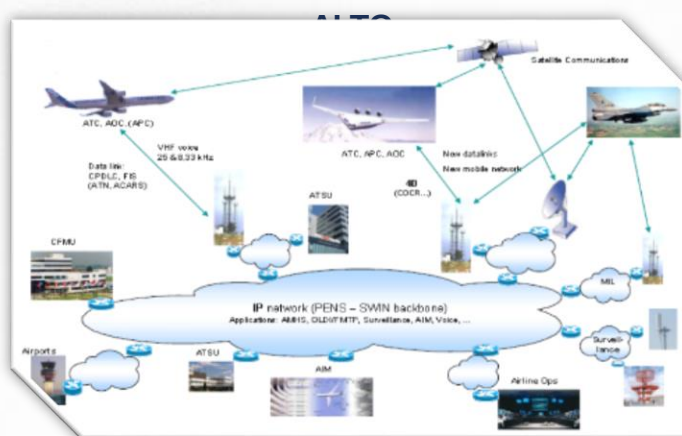

Costo total del proyecto :
Bs 6.960.000

Presupuesto Inicial 2023 :
Bs 6.960.000

Presupuesto Modificado:
Bs 6.960.000

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023:
Bs. 6.858.755

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

*Adquisición, Instalación, homologación y puesta en servicio del Sistema AMHS del aeropuerto Int. “El Alto”, SLLP.
*Proyecto concluido y en funcionamiento.

PROYECTO: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS CATEGORÍA I DEL AEROPUERTO



Costo total del proyecto :
Bs 10.194.779

Presupuesto Inicial 2023 :
Bs 11.136.000

Presupuesto Modificado:
Bs 10.194.779

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023:
Bs. 5.905.979

RESULTADOS GESTIÓN 2023:

Proyecto de Equipamiento y actualización de Sistemas, en ejecución normal con un avance físico del 70%.

EMPRESA BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BoA



Presupuesto Gestión 2023 (expresado en Bs)

Programado inicial: Bs 3.105.404.661

Presupuesto final (adicional): Bs 3.333.423.647

Ejecución 2023: Bs. 2.944.225.490 (88,32%)*



PASAJEROS TRANSPORTADOS 4.532.836
(5,53% MÁS QUE LA GESTIÓN 2022).



38.567 VUELOS REALIZADOS.
(7,4% MÁS QUE LA GESTIÓN 2022)



MÁS DE 10.000 KILOGRAMOS TRANSPORTADOS.

* Datos al 29 de diciembre de 2023

RUTAS BOLIVIANA DE AVIACIÓN



www.boa.bo

✓ **13** rutas nacionales:
Apertura de 2 Rutas en
la Gestión 2023:

- Rurrenabaque
- Riberalta

✓ **7** rutas
internacionales.
Apertura de 2 Rutas
Internacionales:

- La Habana
- Caracas

Costo Total del Proyecto : Bs 52.015.261,56

Presupuesto Inicial 2023 : Bs 21.252.681,00

Presupuesto Adicional 2023 : Bs 13.573.513,95

Capacidad

El Hangar de Mantenimiento BoA - Cochabamba, tendrá una capacidad para 1 avión 767-300 o 2 aviones 737-700/800 (simultáneamente)

Superficie Construida:

9.544,01 m²

Empleos:

Directos: 148 (en etapa de construcción)

Indirectos: 222 (en etapa de construcción)

Beneficiarios

Directos: Personal de mantenimiento BoA, venta de servicios a terceros

Indirectos: Población boliviana

Presupuesto Final 2023: Bs 34.826.194,95
Ejecución 2023 : Bs 32.283.803,78 (92,92%)



Ejecución Física Acumulada:
95,52%
- Ejecución Financiera
Acumulada: 95,52 %

PROYECTO: INCENTIVO AL DESARROLLO TURÍSTICO A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA DE AERONAVES

Costo Total del Proyecto : Bs 121.800.000,00

Presupuesto Inicial 2023 : Bs 17.400.000,00

Presupuesto Adicional 2023 : Bs 70.087.999,84

Presupuesto Final 2023 : Bs 87.487.999,84
Ejecución 2023: Bs 74.640.208,53 (85,31%)


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

BoA incorporó 5 aeronaves Boeing B737-800 NG (4 Gestión 2022 y 1 Gestión 2023) para el servicio nacional e internacional, que reemplazará las aeronaves clásicas que tiene la empresa y mejorará la calidad

Se incorporara 3 aeronaves Airbus 330 – 200 para la atención de rutas internacionales.

Se realizan capacitaciones, compra de herramientas y repuestos para la nueva flota de aeronaves.

Ejecución Física Acumulada:
100%
- Ejecución Financiera
Acumulada: 89.45 %

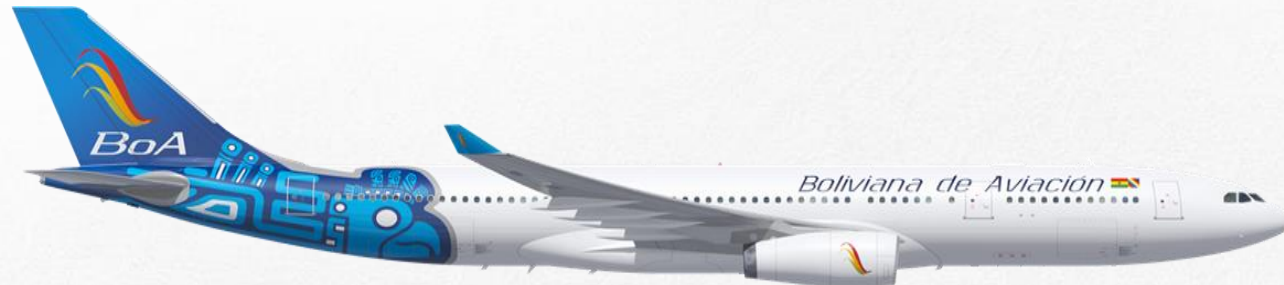

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL



DATOS OPERATIVOS

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PROGRAMADO	EJECUTADO
1. Fortalecer la DGAC institucionalmente, para mantener la sostenibilidad económica, modernizando los procesos de otorgación de certificaciones y autorizaciones, de instrucción y administrativos con eficacia y eficiencia asegurando el cumplimiento de la normativa boliviana.	90%	90%
2. Garantizar altos niveles de seguridad operacional aplicando los elementos críticos de un sistema de vigilancia en procura de una implantación eficiente del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP).	90%	91%
3. Alcanzar altos niveles de seguridad de la aviación civil aplicando los elementos críticos de un sistema de seguridad a fin de minimizar el riesgo ocasionado por actos de interferencia ilícita.	64%	64%
4. Asegurar el desarrollo del transporte aéreo con mayor conectividad aérea y minimizando los impactos y los efectos perjudiciales en el medio ambiente, con la aplicación de medidas que garanticen la salud en el sistema del transporte aéreo en la propagación de enfermedades transmisibles por vía aérea.	Líneas aéreas 17	Líneas aéreas 15

FISCALIZACIÓN – DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Gestión 2023



Unidad de Operaciones

78 Inspecciones Programadas
77 Inspecciones Ejecutadas

99%
Cumplimiento



Unidad de Aeronavegabilidad

148 Inspecciones Programadas
122 Inspecciones Ejecutadas

82%
Cumplimiento



Unidad de Licencias al Personal Aeronáutico

63 Inspecciones Programadas
53 Inspecciones Ejecutadas

84%
Cumplimiento

Cumplimiento Vigilancia DSO 2023 : 88%

FISCALIZACIÓN – DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO

Gestión 2023



AVSEC

259 Inspecciones Programadas

251 Inspecciones Ejecutadas

97%

Cumplimiento



FAL

136 Inspecciones Programadas

114 Inspecciones Ejecutadas

84%

Cumplimiento

Cumplimiento Vigilancia DTA 2023 : 90%

FISCALIZACIÓN – DIRECCIÓN DE NAVEGACION AÉREA

Gestión 2023



AGA

15 Inspecciones programadas
15 Inspecciones Ejecutadas

100%
Cumplimiento



CNS

18 Inspecciones programadas
18 Inspecciones Ejecutadas

100%
Cumplimiento



ATM/SAR

77 Inspecciones programadas
77 Inspecciones Ejecutadas

100%
Cumplimiento

Cumplimiento Vigilancia DNA 2023 : 100%

EJECUCIÓN FINANCIERA

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBROS AL 29 DE DICIEMBRE GESTIÓN 2023

Presupuestado 2023: Bs 72.907.684,00

Ejecución Final 2023 : Bs. 70.663.409,40

RUBRO	RECURSOS		
	PROGRAMADOS	PERCIBIDOS	% EJE.
Venta de Servicios (RIPSA)	247.238,00	308.796,05	124,90%
Tasas (Sobrevuelos, USD5,00 y RIPSA)	53.214.122,00	58.931.044,76	110,74%
Derechos (INAC - RIPSA)	5.029.228,00	7.186.619,84	142,90%
Multas	30.000,00	-	0,00%
Ganancias en Operaciones Cambiarias	-	245.060,15	0,00%
Otros Ingresos	9.957.135,00	1.273.412,58	12,79%
Fondos en Custodia	-	1.052.990,70	0,00%
RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR	4.429.961,00	1.665.485,37	37,60%

RESULTADOS GESTIÓN 2023

✓ Ejecución de presupuesto de ingresos del
96,92%

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Alberto Saucedo Leigues – Viceministro de Vivienda y Urbanismo a.i.)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2023

	Presupuesto Inicial 2023	Ejecución Presupuestaria 2023	% de Ejecución
VICEMINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO	Bs8.526.787	Bs6.128.662	72%
REGULARIZACIÓN DERECHO PROPIETARIO - PROREVI	Bs2.538.693	Bs2.115.851	83%
UNIDAD DE TITULACIÓN - UET	Bs4.954.103	Bs3.784.245	76%
TOTALES	Bs16.019.583	Bs12.028.758	75%

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO

ACCIONES INSTITUCIONALES

- I. Desarrollar el marco normativo de planificación y gestión urbana, acceso al suelo y vivienda.
- II. Gestionar políticas, normas, planes, proyectos y otros instrumentos de gestión de desarrollo urbano territorial y vivienda.

PROGRAMADO INICIAL



- PLAN MULTISECTORIAL URBANO.

- GUÍA NACIONAL DE ZONIFICACIÓN Y VALUACIÓN ZONAL

RESULTADO 2023

➤ Plan Multisectorial en proceso de revisión y ajustes, para su posterior implementación en los diferentes municipios.

➤ Documento concluido, para ser APROBADO, mediante Resolución Ministerial.

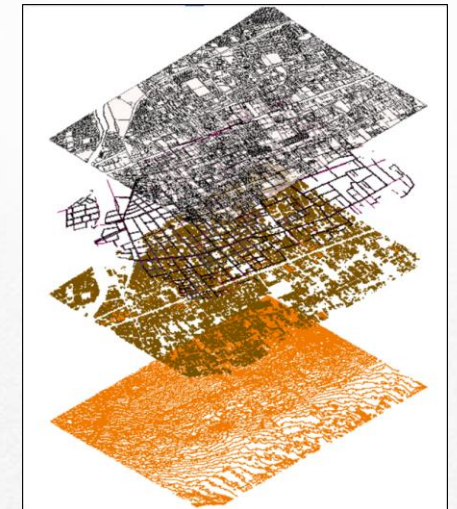

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO

- Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC) consensuada y concluida, para fortalecer la planificación, consolidación y desarrollo de ciudades.

- Programa de Generación de Capacidades, para fortalecer el conocimiento en Desarrollo Urbano.

■ En proceso de revisión para su aprobación e implementación en el Estado Plurinacional de Bolivia.

■ Se capacitó a profesionales de diferentes instituciones Públicas y Privadas con dos diplomados en: "Ordenamiento territorial y planificación urbana" y "Gestión Pública del Desarrollo Urbano", además de 2 cursos cortos de 20 horas en Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades PNDIC y Proceso de Delimitación y Homologación de Áreas Urbanas



VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

UNIDAD DE POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMADO INICIAL

- POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA (PNV) aprobada y socializada a nivel nacional, brindando los lineamientos de la VIVIENDA ADECUADA.

RESULTADO 2023

- Documento concluido, para ser APROBADO, mediante Resolución Ministerial.

- GUÍA PRÁCTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ADECUADAS.

- Documento concluido, APROBADO, mediante Resolución Ministerial.



VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

UNIDAD DE POLÍTICAS DE VIVIENDA



ACCIONES INSTITUCIONALES

- I. Gestionar y coordinar la elaboración de normas , reglamentos e instrumentos técnicos en el marco de las políticas de vivienda.

RESULTADO 2023

-NORMA BOLIVIANA DE DISEÑO SÍSMICO, APROBADA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL

- Se realizó el seguimiento al Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional (PPRDH) en procura de satisfacer las necesidades de la población más vulnerable.
- Se realizó la Evaluación de Medio Término del Plan Plurianual de Reducción de Déficit Habitacional 2021-2025, en el cual se recomienda la inclusión de los Gobiernos Autónomos Indígenas Originario Campesinos GAIOCs.



PROGRAMA DE REGULARIZACION DE DERECHO PROPIETARIO (PROREVI)

LEY No. 247 – Regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda.

OBJETIVO

Coadyuvar mediante la asistencia técnica y legal a Entidades Territoriales Autónomas, Institución del Nivel Central del Estado y personas naturales para la regularización del derecho propietario en sus tres componentes; Corrección de Datos en Folio Real, Regularización Judicial y Transferencias de bienes inmuebles destinado a vivienda, ubicados dentro de radios urbanos o áreas urbanas homologadas.

BENEFICIARIOS

Personas Naturales que se encuentran en posesión continua pública, pacífica y de buena fé de un bien inmueble urbano destinado a vivienda.

Presupuesto Inicial 2023

Bs. 2.538.693

Títulos de Derecho Propietario inicial 2023

2.400 Títulos a través de procesos judiciales

Correcciones al Título de Derecho Propietario inicial 2023

18.100 Correcciones al título (Folio Real)

Ejecución Presupuestaria 2023

Bs. 2.115.851

Títulos de Derecho Propietario Final 2023

1.901 Títulos a través de procesos judiciales

Correcciones al Título de Derecho Propietario Final 2023

10.352 Correcciones al título (Folio Real)

OBJETIVO

Recuperar Cartera y Aportes al Régimen de Vivienda Social, Concluir los Procesos de Cobro, Verificar los Pagos de Cartera y Aportes, Regularizar el Derecho Propietario de los Adjudicatarios y Proyectos Habitacionales, Además Asumir la Defensa Legal de la Unidad Ejecutora de Titulación.

BENEFICIARIOS

Son los Adjudicatarios y Ocupantes de las diferentes Soluciones Habitacionales otorgadas por las Entidades de Vivienda absorbidas por la Unidad Ejecutora de Titulación.

Presupuesto Inicial 2023

Bs 4.954.103

Recuperación de recursos por los rubros inicial 2023

Cartera, Aportes al Régimen de Vivienda, Empresas: Bs. 800.000

Conclusión de procesos de recuperación de aportes por concepto de cartera inicial 2023

720 Procesos

Emisión y entrega de Minutas a nivel Nacional inicial 2023

495 Minutas

Cierre técnico financiero, legal y administrativo de proyectos habitacionales:

2 Proyectos habitacionales

Prosecución de procesos judiciales Inicial 2023

373 Procesos

Presupuesto Final 2023

Bs 3.784.245

Recuperación de recursos por los rubros final 2023

Cartera, Aportes al Régimen de Vivienda, Empresas: Bs.
1.244.093,57

Conclusión de procesos de recuperación de aportes por concepto de cartera final 2023

481 Procesos

Emisión y entrega de Minutas a nivel Nacional final 2023

461 Minutas

Cierre técnico financiero, legal y administrativo de proyectos habitacionales:

2 Proyectos habitacionales

Prosecución de procesos judiciales final 2023

148 Procesos

CENTRO DE COMUNICACIÓN LA PAZ (CCLP)



OBJETIVO

Efectuar en las instalaciones del Edificio Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP) el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctrico, hidrosanitario y de estructura civil. Brindar los servicios de telefonía transporte vertical, seguridad, limpieza, jardinería y calefacción. Perfeccionar de los procesos que realiza y la calidad de los servicios que presta



Presupuesto Inicial 2023

Bs9.152.350

Presupuesto Reprogramado 2023


Bs.12.459.590

Presupuesto Ejecutado 2023

Bs11.993.319,54

PRESUPUESTO C.C.L.P. GESTIÓN 2023

PROYECTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución	% Ejecución Vs. Vigente
CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ	9.152.350	12.459.590	11.993.320	96%

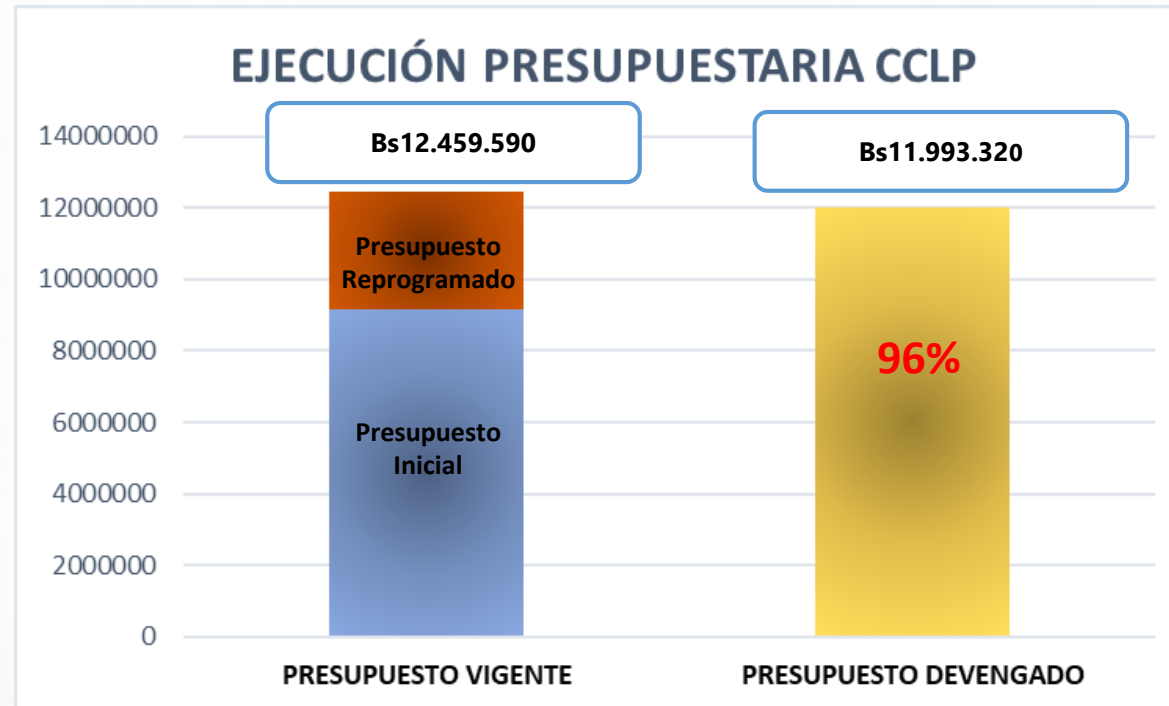

LOGROS REALIZADOS GESTIÓN 2023

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ

Costo Total

Bs4.640.298

Sistema de Calefacción



Sistema de Bombas de Agua



Pantallas Led



IMPACTO DEL PROYECTO

- Se brinda mejor comodidad y confort en tema de CALEFACCION a los servidores públicos y visitantes del edificio, especialmente en época de invierno y paralelamente se modernizó con termostatos digitales que mide la temperatura de manera automática el ambiente.
- La modernización de las bombas de agua reduce el consumo de energía eléctrica, redujo los decibeles de ruido, mantenimiento menos costoso y el suministro de agua se garantiza las 24 horas del día.
- La difusión de imágenes y videos tiene mayor alcance, con funciones múltiples dirigidos de forma remota desde un ordenador y es resistente a las condiciones climatológicas adversas.



AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA



AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

OBJETIVO

Coordinar y promover la reducción de déficit habitacional en Bolivia, favoreciendo a la población de bajos niveles de ingreso y altamente vulnerables, a través de la ejecución y acceso de programas de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad, en coordinación con los diferentes sectores de la sociedad y las entidades territoriales autónomas.

BENEFICIARIO

Toda la población del Estado Plurinacional de Bolivia, con proyectos y programas de vivienda cualitativa y cuantitativa.

PROGRAMADO: 128.678 personas beneficiadas

EJECUTADO: 78.645 personas beneficiadas

META PROGRAMADA

Programado inicial 2023:
Bs 1.911.981.623

Ejecutado Final 2023:
Bs 1.872.510.418

Número de Viviendas Cuantitativas

Programado inicial 2023:
17.929 Soluciones Habitacionales

Ejecutado y en Ejecución final 2023:
12.507 Soluciones Habitacionales

Número de Viviendas Cualitativa

Programado inicial 2023:
18.836 Soluciones Habitacionales

Ejecutado y en Ejecución final 2023:
9.963 Soluciones Habitacionales

META PROGRAMADA



SOLUCIONES
HABITACIONALES
COMPROMETIDAS EN GESTIÓN
Y CONTRATACIÓN
14.295 S.H.

SOLUCIONES
HABITACIONALES
PROGRAMADO
36.765 S.H.




SOLUCIONES
HABITACIONALES
CONCLUIDAS Y EJECUTADAS
22.470 S.H.



CONCLUIDOS
12.314 S.H.



EN EJECUCION
10.156 S.H.

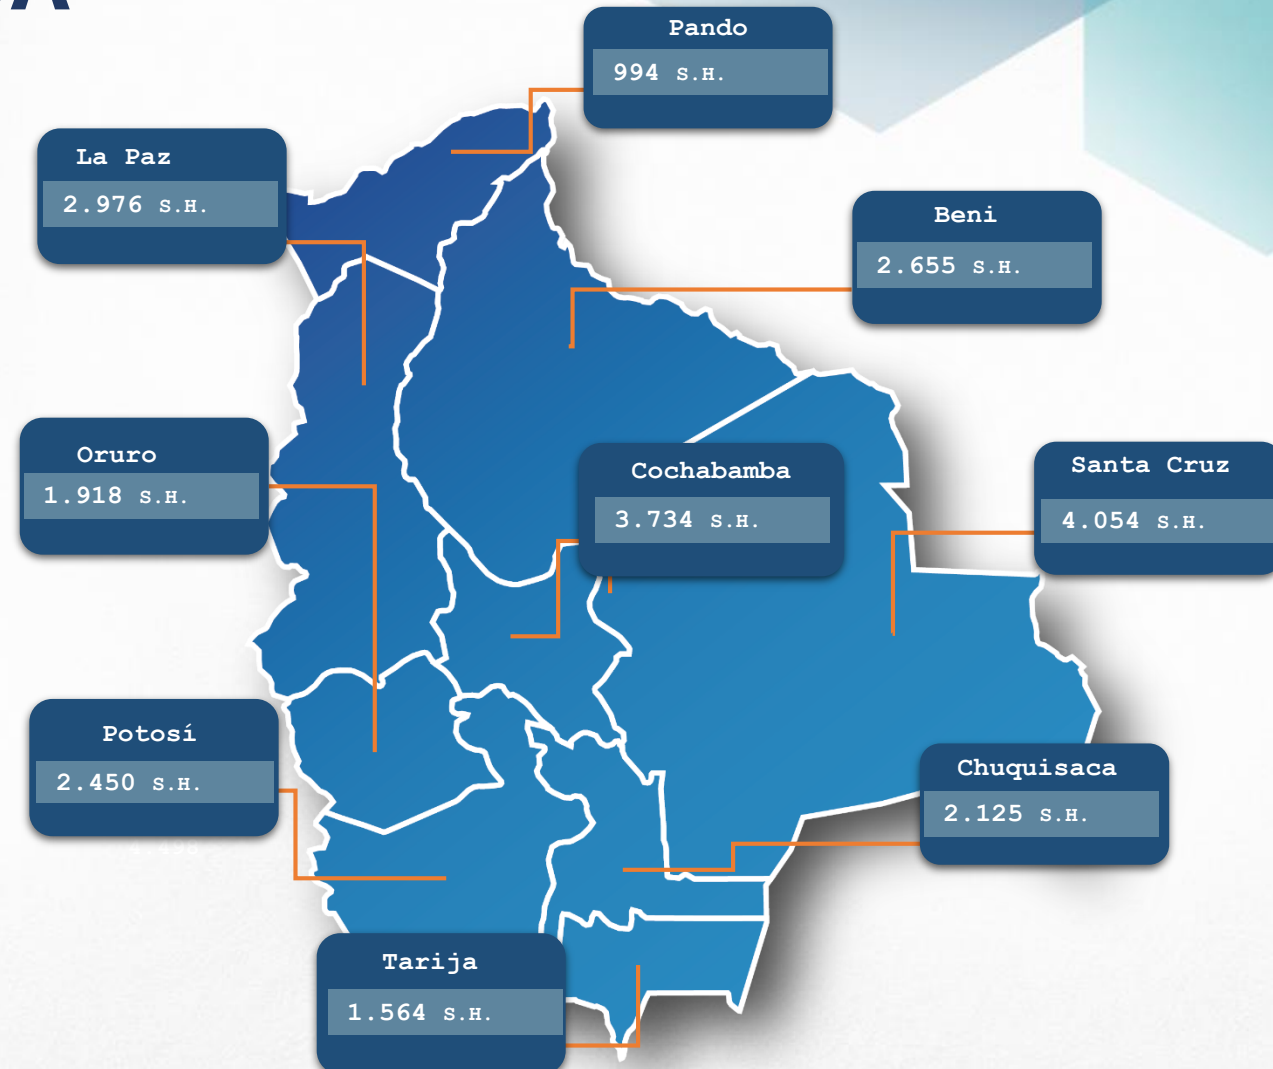

VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

(Gonzalo Mamani Quispe – Viceministro de Telecomunicaciones a.i.)

IMPLEM. INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES POR FIBRA OPTICA FASE III

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO (BS.)

Bs
367.360.000,00

PRESUPUESTO
INICIAL 2023 (BS.)

Bs
102.493.440,00

PRESUPUESTO
VIGENTE 2023 (BS.)

Bs
6.542.134,47

PRESUPUESTO
EJECUTADO FINAL 2023
(BS.)

Bs
6.542.134,47

EJECUCIÓN
FINANCIERA %

100 %

A la fecha Entel S.A. realizó **la entrega de 3 sitios** con el despliegue de **fibra óptica** en funcionamiento, beneficiando aproximadamente a **5.616 habitantes**, y en proceso de implementación **31 Capitales de Municipio, 3 Autonomías Indígena Originaria Campesinas y 3 localidades** Objetivo del Plan nacional de Banda Ancha.

IMPLEM. INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES POR RADIO BASES FASE III

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO (BS.)

Bs
251.482.000,00

PRESUPUESTO
INICIAL 2023 (BS.)

Bs
69.828.983,00

PRESUPUESTO
VIGENTE 2023 (BS.)

Bs
46.775.652,00

PRESUPUESTO
EJECUTADO FINAL 2023
(BS.)

Bs
46.775.652,00

EJECUCIÓN
FINANCIERA %

100 %

103 radio bases en funcionamiento para beneficiar a **103** localidades. Mediante Contrato Modificatorio N° 3 se adicionó **40** radio bases, para brindar el servicio de telefonía e internet móvil a **40** localidades, beneficiando a una población aproximada **29.574** habitantes.

El saldo del presupuesto, corresponde a la retención de la garantía.

INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES POR RADIO BASES FASE IV

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO (BS.)

PRESUPUESTO
INICIAL 2023 (BS.)

PRESUPUESTO
VIGENTE 2023 (BS.)

PRESUPUESTO
EJECUTADO FINAL 2023
(BS.)

EJECUCIÓN
FINANCIERA %

Bs
708.527.341,09

Bs
0,00

Bs
97.181.317,41

Bs
97.181.317,41

100 %

Con la suscripción del Contrato Principal se beneficiarán **220 localidades rurales**. Adicionalmente, con el Contrato Modificadorio N° 1 se incremento **92 localidades rurales**.

Con la ejecución de esta fase se brindara el servicio de telefonía e internet móvil a un total de **312 localidades rurales**, beneficiando a una población aproximada **48.725 habitantes**.

INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES POR RADIO BASES FASE V

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (BS.)	PRESUPUESTO INICIAL 2023 (BS.)	PRESUPUESTO VIGENTE 2023 (BS.)	PRESUPUESTO EJECUTADO FINAL 2023 (BS.)	EJECUCIÓN FINANCIERA %
Bs 386.067.435,57	Bs 0,00	Bs 179.521.357,53	Bs 179.521.357,53	100 %

165 radio bases para beneficiar a **165** localidades rurales con acceso a telefonía e internet móvil, beneficiando a una población aproximada de **29.764** habitantes.

PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE INCLUSION SOCIAL - PRONTIS

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL 2023
INVERSIÓN	Bs172.322.423

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO FINAL 2023
INVERSIÓN	Bs330.020.461,41

Se alcanzó una ejecución presupuestaria **191%** respecto al presupuesto inicial programado, lo que permitió contar con **103** localidades con servicio de telefonía e internet móvil y **517** Radio Bases en proceso de instalación.

Agencia Boliviana Espacial



AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL - ABE

PRESUPUESTO
INICIAL 2023 (BS.)

Bs
242.696.665,00

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023
(BS.)

Bs
238.272.301,00

EJECUCIÓN
FINANCIERA %

98%

INGRESOS
PERCIBIDOS POR
SERVICIOS
SATELITALES 2023
(BS.)

Bs
282.409.660,61

INGRESOS %

116%

✓ **41.022.000,00** bolivianos aporte al **Bono Juancito Pinto**


✓ **99.513.624,00** bolivianos transferencia al TGN en el marco del **Convenio Subsidiario de préstamo.**



AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL - ABE

Principales servicios prestados:

- Radio bases móviles conectadas
 - Conexiones a internet empresariales y domesticas.
 - Servicio de Radio y Televisión gratuita para la población .
- ✓ **90%** de la capacidad del satélite ocupado

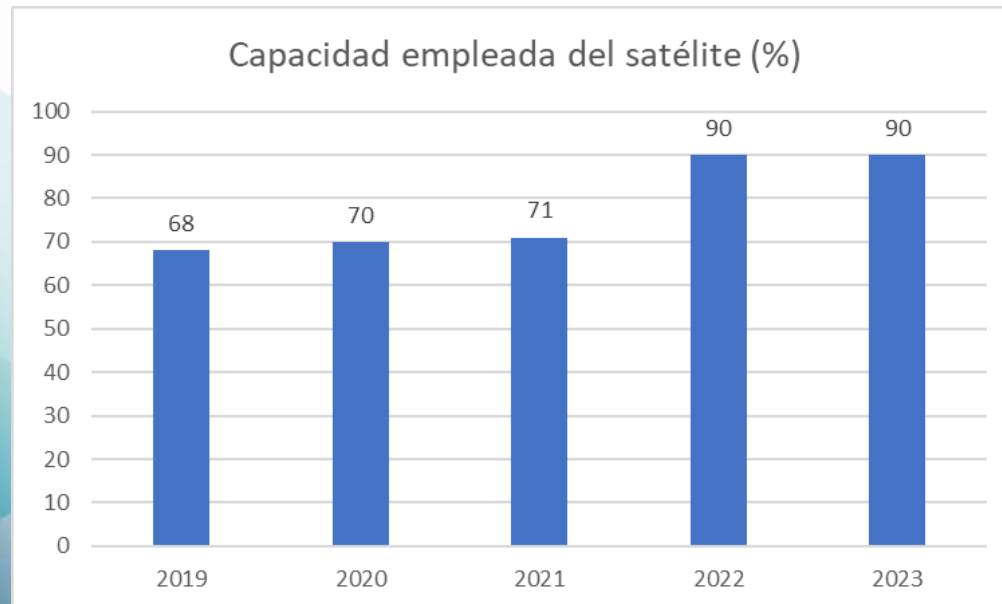

Agencia Boliviana de Correos



PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU)


CONCEPTO	APROBADO	EJECUTADO	EJECUCION
	DOLARES	DOLARES	%
1. SISTEMA IPS – EQUIPOS INFORMATICOS (Computadoras, lectores, impresoras, balanzas)	215.959	192.366	89%
2. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (4 Minibuses y 15 Motocicletas)	246.669	226.010	92%
TOTAL FINANCIAMIENTO UPU	462.598	418.376	90%



- Realizar seguimiento en línea con el sistema de localización de envíos, desde origen a destino.
- Clientes con acceso a compras por Internet.
- Reducción de plazos de entrega a clientes a nivel nacional.



INCREMENTO ANUAL DE VOLUMEN DE IMPORTACIÓN
KG DE CORREO TRAD. Y ENVÍOS CERTIFICADOS - GESTIÓN 2023

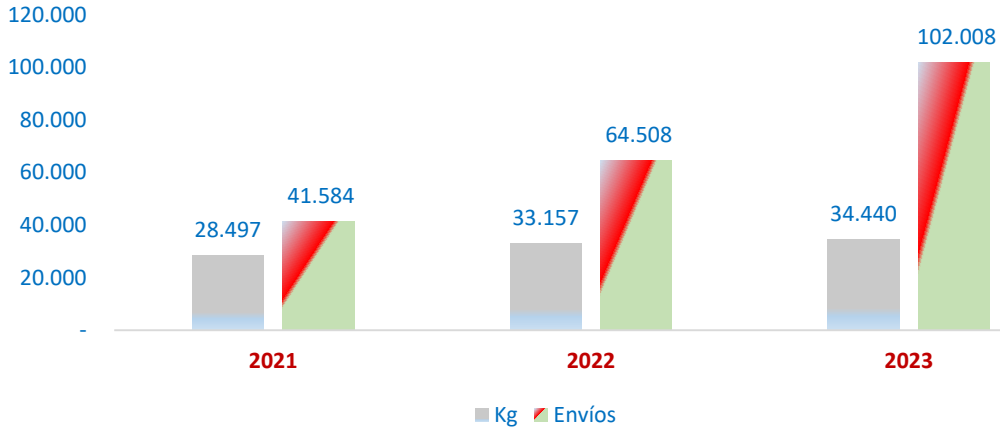


CRECIMIENTO DE N° DE ENVÍOS

AÑO	KG	N° DE ENVÍOS	% CRECIMIENTO EN ENVÍOS
2021	28.497	41.584	
2022	33.157	64.508	55%
2023	34.440	102.008	58%

CRECIMIENTO EN INGRESOS

RECAUDACION POR VENTA DE SERVICIOS

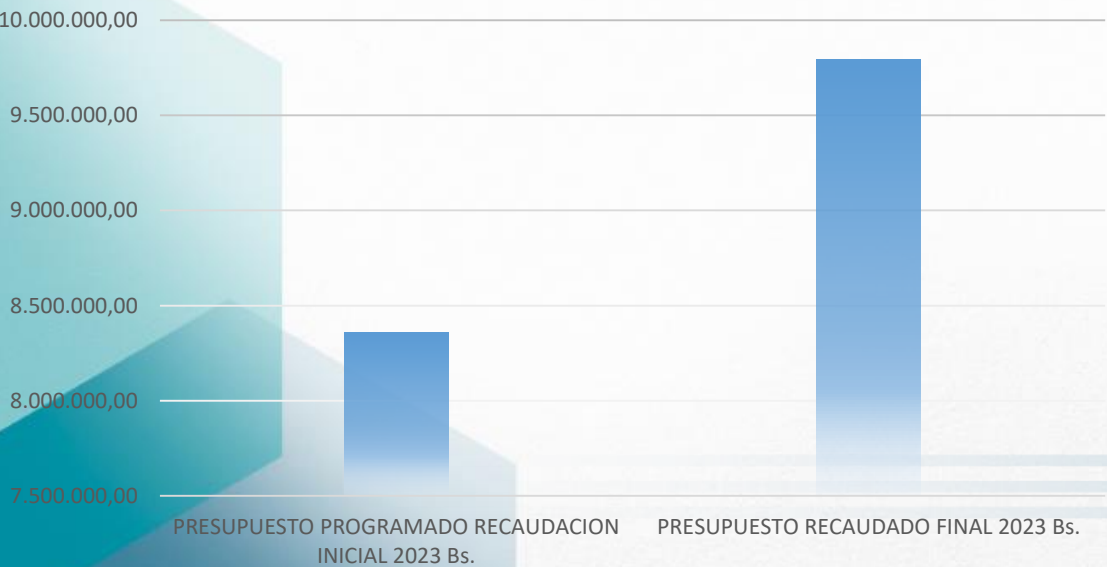

PRESUPUESTO PROGRAMADO RECAUDACION INICIAL 2023 Bs.	PRESUPUESTO RECAUDADO FINAL 2023 Bs.	% DE CRECIMIENTO
8.360.543,00	9.796.962,21	117%

PAGOS REALIZADOS A LA GESTORA PÚBLICA DEUDA AFP - EX ECOBOL

PAGO A GESTORA PÚBLICA SALDOS DE AFP'S - DEUDAS DE EX ECOBOL

N°	Mes - 2023	Importe Bs.
1	Mayo	3.916.991,67
2	Septiembre	3.916.991,67
3	Diciembre	3.135.582,08
TOTAL		10.969.565,42

- ✓ Cumplimiento de compromisos con jubilados de la Ex – ECOBOL (acta de fecha 13 de marzo del 2023)
- ✓ Pago a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
- ✓ Disminución de pasivos de la Ex - ECOBOL

EMISION DE SELLOS POSTALES 2023



- 1ra emisión (2023) – en cumplimiento al Programa Anual de Emisión de Sellos Postales se puso en circulación 30.000 unidades para su comercialización, desde el 7 de diciembre de 2023.



- 2da. Emisión - en circulación 30.000 unidades “Navidad 2023”, para su comercialización desde el 19 de diciembre de 2023.

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT



**AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

PROYECTO: ADQUI. SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO LP

- Se concretó la firma y adjudicación de las empresas de Supervisión e Implementación del Proyecto de Inversión: ***“Adqui. Sistema de Monitoreo del Espectro Electromagnético LP”***.
- El impacto se traducirá en impulsar el desarrollo tecnológico en el país con objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia en torno a la comprobación técnica de emisiones electromagnéticas en todo el territorio nacional, beneficiando a la sociedad en general a través de un control eficiente evitando y reduciendo las interferencias locales y regionales.

Presupuesto Ejecutado Final
2023

Bs 34,708,751



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
